

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАРЬЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №4» городского округа город Шарья
Костромской области (МОУ СОШ №4)
157501, Костромская область
г.Шарья, ул. им. А.С.Громова, д.44
телефон: 5-11-91. 5-11-78
ИНН/КПП 4407005296/ 440701001
ОГРН 1024402035921 ОКПО 41648339
№ _____
30 июля 2018 г

Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Костромской области

Территориальный отдел в Шарьинском
районе

Информация об устранение предписаний №52 от 26 марта 2018 г.

Срок выполнения предписаний – до 01. 08. 2018 г

Предписание	Результат выполнения
1.Провести ремонт стен медицинского кабинета приема и прививочного кабинета	Выполнено. Убраны трещины на стенах выше панелей в медицинском кабинете приема и прививочном кабинете ,
	
кабинет приема	прививочный кабинет
2.Провести ремонт потолка в кабинете приема	Выполнено. Убраны щели между отделочными плитами ДВП
	

3.Провести ремонт потолка в кабинете №2	Выполнено. Потолочная плитка приклеена
	
4.Провести ремонт потолка в спортивном зале.	Не выполнено. Представлены ходатайства начальнику управления образования Маховой О.В. (входящий номер 1061 от 18.04.18) и главе городского округа Г.Шарья Неганову Э.Г. (вход.номер2127 /0204 от 18.04.2018) по выполнению предписаний, получены ответы (прилагаются). Направлена заявка в ЖКХ на выполнение сметы по ремонту потолка в спортивном зале (вх.номер 1552/0103 от 05.07.18).
5.Провести ремонт потолка в (переход между зданиями)	Выполнено. Потолок околочен плитой МДФ, стыки между плитой зашпаклеваны, потолок покрашен
	
6.Провести ремонт потолка в гардеробе	Выполнено. Потолок околочен плитой МДФ, стыки между плитой зашпаклеваны, потолок покрашен




7.Провести ремонт потолка в столярной мастерской

Выполнено. Проведена герметизация швов между отделочной плитой ДВП



8.Провести ремонт стен в кабинете №6

Выполнено. Стены обиты гипсокартоном, окрашены

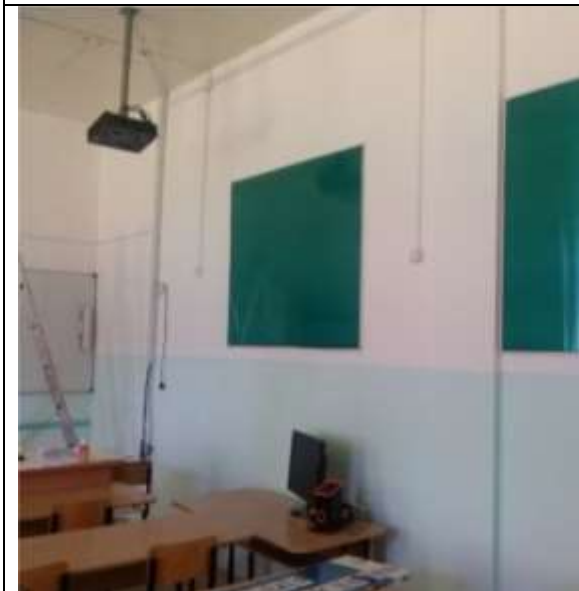

Выполнено. Стены окрашены, не белятся.


9.Провести ремонт стен в кабинете биологии	
	
10.Провести ремонт стен в кабинете информатики	Выполнено. Стены отштукатурены и покрашены
	
11. Провести ремонт стен в кабинете учителя-логопеда	Выполнено. Стены околочены плитой МДФ и окрашены
	
12. Провести ремонт стен в кабинете музыки	Не выполнено. Представлены ходатайства начальнику управления образования Маховой О.В. (входящий номер 1061 от 18.04.18) и главе городского округа Г.Шарья Неганову Э.Г. (вход.номер2127 /0204 от 18.04.2018) по выполнению предписаний, получены ответы (прилагаются). Направлена заявка в ЖКХ на выполнение сметы по ремонту потолка в спортивном зале (вх.номер 1552/0103 от 05.07.18).

13. Провести ремонт стен в кабинете технологии	Выполнено. Зацементирована, отштукатурена и побелена стена у дверного проема, заштукатурены и покрашены щели на стенах
	
14. Провести ремонт стен в гардеробе	Выполнено. Стены окрашены.
	
15. Провести ремонт стен в библиотеке	Выполнено. Стены отремонтированы : прошпаклеваны и окрашены, стена, околоченная доской - вагонкой заменена на плиту МДВ.
	




16. Ремонт стены на лестничной площадке

Выполнено. Все щели на стенах лестничной площадке убраны

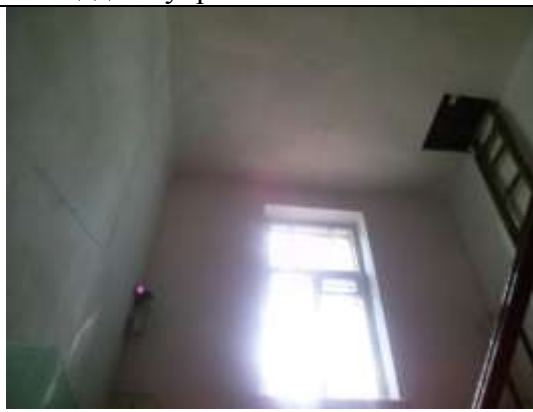

17. Ремонт пола в кабинете музыки

Выполнено. Щели на полу между стыками ламинированной плиты зашпаклеваны.

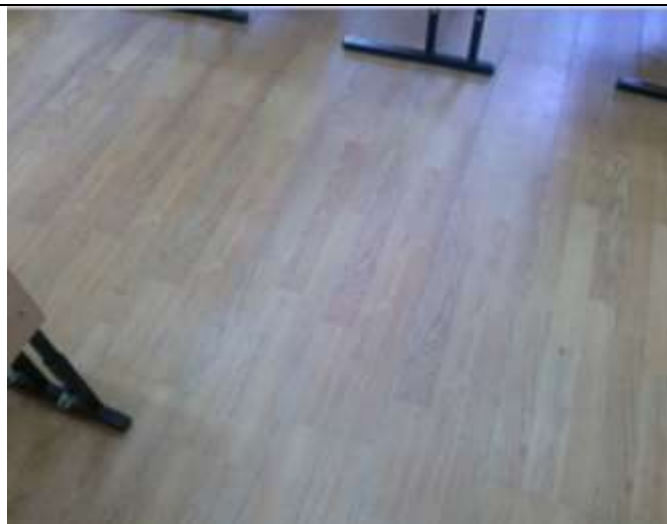

18. Ремонт пола в спортивном зале

Выполнено. По всему периметру полов установлены плинтуса. Щели между плинтусами и стенами заштукатурены



19. Ремонт пола в буфете перед обеденным залом	Выполнено. Пол заменен.
	
20 Ремонт пола в моечном помещении	
	
21 Ремонт пола в рекреации у кабинета зам. директора	Выполнено
	
22. Кабинет физики (химии) оборудовать демонстрационным столом, который должен быть установлен на подиуме	Выполнено
  	

23. Моечные ванны в буфете, являющиеся источниками повышенного выделения влаги, оборудовать локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения	Выполнено
	
24. Провести мероприятия по приведению в мастерских эквивалентного уровня звука (шума) в столярной мастерской на рабочих местах у фуговального комбинированного станка ФКС-3 и токарного станка по дереву ТД-120 до гигиенических нормативов	Ремонт станков проведен. Эквивалентный уровень звука (шума) соответствует нормативам. Протокол измерения шума № 223-Ш от 20 июля 2018г прилагается

Директор _____ Е. А.Латухина
